



**Kontroly dodavatelů
30.11.2022**

Běžná údržba silnic

Hodnocení uplynulého roku 2022

- 10 dodavatelů
- 40 cestmistrovských obvodů
- V časovém období ½ říjen – ½ listopad 2022
- Kontroly - celkových 138
- Výhrada 11 cca 7%
- Informace cestmistřovi či jeho přítomnost na místě

Kontroly rozbor

Cestmistrovství		Počet km silnic II. a III. třídy	počet kontrol	Provedeny	provedeny s výhradou	neprovedeny	vyhovuje	vyhovuje s výhradou	nevyhovuje	objednáno x nefakturováno / nenalezeno
Benešov	BES	198,7	4	4	0	0	4	0	0	0
Votice	BES	184,7	3	3	0	0	3	0	0	0
Vlašim	BES	223,1	3	3	0	0	3	0	0	0
Příbram	BES	194,8	3	3	0	0	3	0	0	0
		801,3	13	13	0	0	13	0	0	0
Tloskov	ZKP	208,4	3	3	0	0	3	0	0	0
Říčany	ZKP	171,8	3	3	0	0	2	1	0	0
Velké Popovice	ZKP	186,1	5	5	0	0	5	0	0	0
Mělník	ZKP	203,4	3	3	0	0	3	0	0	0
Mšeno	ZKP	196,8	3	3	0	0	3	0	0	0
		966,5	17	17	0	0	16	1	0	0
Čechtice	ČNES	191,2	3	3	0	0	3	0	0	0
Rožmitál	ČNES	177,7	3	3	0	0	3	0	0	0
Rakovník	ČNES	435,2	6	6	0	0	6	0	0	0
Žandov	ČNES	197,5	3	3	0	0	3	0	0	0
Poděbrady	ČNES	156,4	3	3	0	0	3	0	0	0
		1 158,0	18	18	0	0	18	0	0	0
Dobříš	Silnice TS	183,9	3	3	0	0	3	0	0	0
Sedlčany	Údržba silnic	186,4	3	3	0	0	3	0	0	0
Sedlec-Prčice		191,5	3	3	0	0	3	0	0	0
		377,9	6	6	0	0	6	0	0	0

Kontroly rozbor

Fialka	AVE	194,5	3	3	0	0	2	1	0	0
Slaný	AVE	501,2	5	2	3	0	2	3	0	0
Králův Dvůr	AVE	445,6	6	6	0	0	6	0	0	0
Žebrák	AVE	217,4	4	4	0	0	4	0	0	0
Nové Strašecí	AVE	270,3	4	3	1	0	2	2	0	0
		1 629,0	22	18	4	0	16	6	0	0
Kutná Hora	Silnice Čáslav	198,9	3	2	1	0	2	1	0	0
Čáslav		207,6	3	3	0	0	3	0	0	0
Zbraslavice	Silnice Čáslav	213,0	3	3	0	0	3	0	0	0
Kolín		165,9	3	3	0	0	3	0	0	0
Radovesnice II	Silnice Čáslav	179,4	3	3	0	0	3	0	0	1
Zásmuky		185,3	3	3	0	0	3	0	0	0
		1 150,1	18	17	1	0	17	1	0	1
Nymburk	PKB	195,8	3	3	0	0	3	0	0	0
Městec Králové	PKB	187,5	3	3	0	0	3	0	0	0
Zbraslav	PKB	288,7	3	3	0	0	3	0	0	0
Dolínek	PKB	183,2	3	3	0	0	3	0	0	0
Mochov	PKB	192,3	3	3	0	0	3	0	0	0
		1 047,5	15	15	0	0	15	0	0	0
Český Brod	UK sro	195,1	5	5	0	0	5	0	0	0
Rudná	UK sro	135,1	3	3	0	0	3	0	0	0
		330,2	8	8	0	0	8	0	0	0
Benátky	USK	211,9	3	3	0	0	3	0	0	0
Bezděčín	USK	169,0	5	5	0	0	5	0	0	0
Bělá p.B.	USK	193,0	3	3	0	0	3	0	0	0
Mn.Hradiště	USK	245,0	4	4	0	0	4	0	0	0
Dřínov	USK	185,5	3	1	2	0	1	2	0	0
		1 004,4	18	16	2	0	16	2	0	0
celkový počet		8 648,80	138	131	7	0	128	10	0	1
		počet kilometrů	počet kontrol	Provedeny	provedeny s výhradou	neprovedeny	vyhovuje	vyhovuje s výhradou	nevyhovuje	nenalezeno

Průběh

- Info CMS o dni kontroly
- Výběr kontrolované práce sekání, opravy vozovek, hloubení příkopu,...
- Návštěva místa realizace
- Vizuální zhodnocení provedené práce
- Fotodokumentace
- Protokol
- Nakonec info CMS či vedoucímu oblasti
- Pokračování kontrol v roce 2023 napříč všemi CMS

Výhrady:

- III/23713 špatná oprava – otevřená struktura obrusné vrstvy



- Nevhodně zvolený tvar opravy silnice



Výhrady:

- Špatný přechod opravy navázání



Nejčastější výhrady

- Nedodržování technologických postupů

U výspravy asf. směsí za horka


- Chybějící či nedostatečný spojovací postřik
- Neplynulé napojení opravy komunikace ke stávajícímu povrchu (absence TURBA či zálivky)
- Použití asf směs pro ložnou vrstvu – otevřená struktura
- Zimní údržba:
- Nedostatečné dávkování chemického posypu
- Jízda bez předsazené radlice i za sněhové pokrývky

- Dle ceníku, nákl. položky 21712
- **Vysprávky výtluků asfaltovou směsí za horka**
- označení pracoviště dopravním značením a doprava asfaltové směsi na pracoviště
- dodávka veškerého provozního materiálu
- provedení spojovacího postřiku
- vyplnění výtluhu asf. betonem s převýšením pro hutnění
- hutnění
- přejezd k dalšímu výtluhu
- příprava mechanismů na odjezd z pracoviště
- zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek

Dobře odvedená práce



Dobře odvedená práce

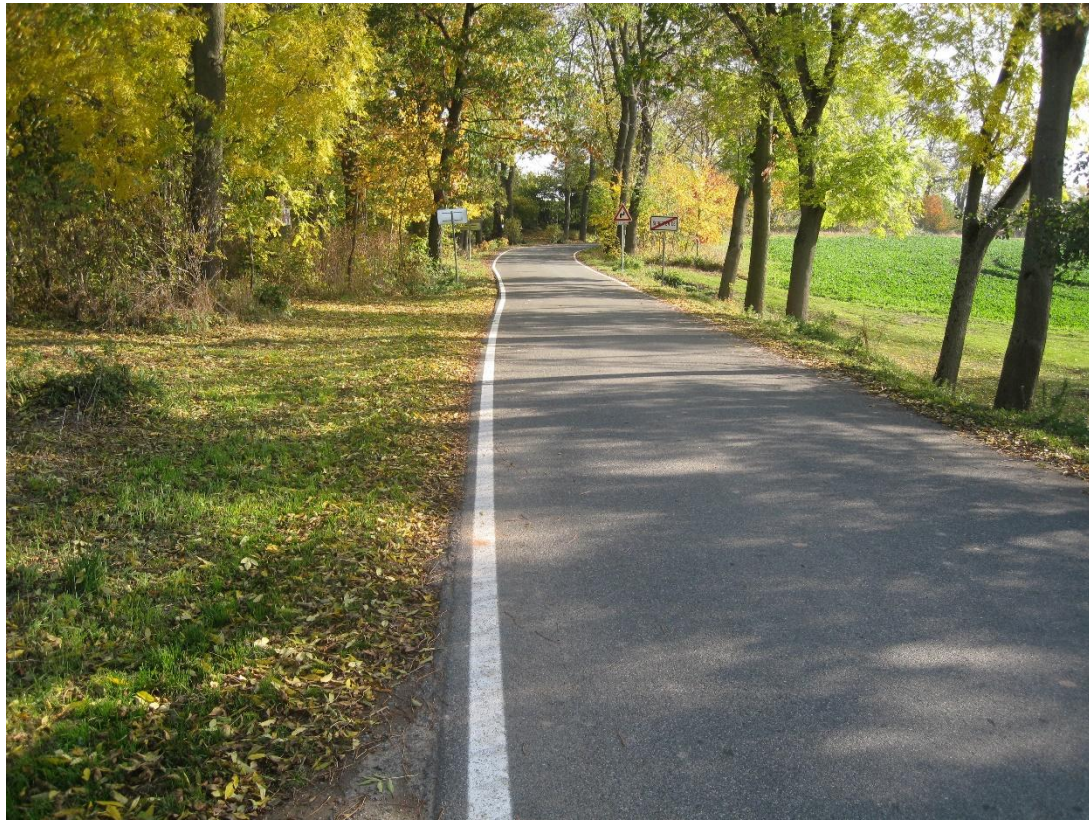

Dobře odvedená práce



Hodnocení:

- Nákup nové techniky pro CMS? Počet?
- Lokalizovat den a čas provedení objednaných prací – pro dohled cestmistra.
- Důraz na kvalitu pracím technologické postupy!
- Oznámení CMS termín výkonu objednané práce.

- Děkuji za pozornost.
